

石川農林\_出来形フォーマットサンプル

# 測定結果一覧表

工 種 集水桝・マンホール工

種 別 集水桝

測 定 者 福井 太郎

㊦

測定項目	基準高			厚さ t1			厚さ t2			略 図
	規格値	mm		-20	mm		-20	mm		
管理基準値	± 25	mm		-15	mm		-15	mm		
測点又は区分	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	
No.1	10.010	10.020	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	
No.2	10.020	10.020	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.3	10.030	10.020	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10	
No.4	10.040	10.040	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.5	10.050	10.060	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	
No.6	10.060	10.060	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.7	10.070	10.060	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10	
No.8	10.080	10.080	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.9	10.090	10.100	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	
No.10	10.100	10.100	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.11+1.0	10.110	10.100	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10	
No.12	10.120	10.120	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.13	10.130	10.140	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	
No.14	10.140	10.140	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.15	10.150	10.140	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10	
No.16	10.160	10.160	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.17	10.170	10.180	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10	
No.18	10.180	10.180	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	
No.19	10.190	10.180	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10	
No.20	10.200	10.200	0	0.150	0.150	0	0.150	0.150	0	

## 上部コンクリート出来形測定表

工 事 名 サンプル工事

2004年10月30日

現場代理人 福井一郎 印

スパン No.	測定月日	測定結果				略 図 (記入例)
		基準高	厚さ	厚さ		
No. 1	16/11/1	10.020	0.160	0.160		
No. 2	16/11/2	10.020	0.150	0.150		
No. 3	16/11/3	10.020	0.140	0.140		
No. 4	16/11/4	10.040	0.150	0.150		
No. 5	16/11/5	10.060	0.160	0.160		
No. 6	16/11/6	10.060	0.150	0.150		
No. 7	16/11/7	10.060	0.140	0.140		
No. 8	16/11/8	10.080	0.150	0.150		
No. 9	16/11/9	10.100	0.160	0.160		

# 森林整備施工出来形管理表

標準地 No. (面積 m2)

測定者 福井 太郎

No.	樹種	齡級	基準高	厚さ	厚さ		設計値	出来形値	設計値	出来形値	設計値	出来形値	備考
					設計値	出来形値							
(1)	(2)	(3)	(4) m	(5) m	(6) m	(7) m	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
No. 1			10.020	0.160	0.150	0.160							
No. 2			10.020	0.150	0.150	0.150							
No. 3			10.020	0.140	0.150	0.140							
No. 4			10.040	0.150	0.150	0.150							
No. 5			10.060	0.160	0.150	0.160							
No. 6			10.060	0.150	0.150	0.150							
No. 7			10.060	0.140	0.150	0.140							
No. 8			10.080	0.150	0.150	0.150							
No. 9			10.100	0.160	0.150	0.160							
計			90.460	1.360	1.350	1.360							




## 中詰・蓋コンクリート出来形管理表

工事名 サンプル工事

2004年10月30日

ケーソンNo. No. 1

現場代理人 福井一郎 印

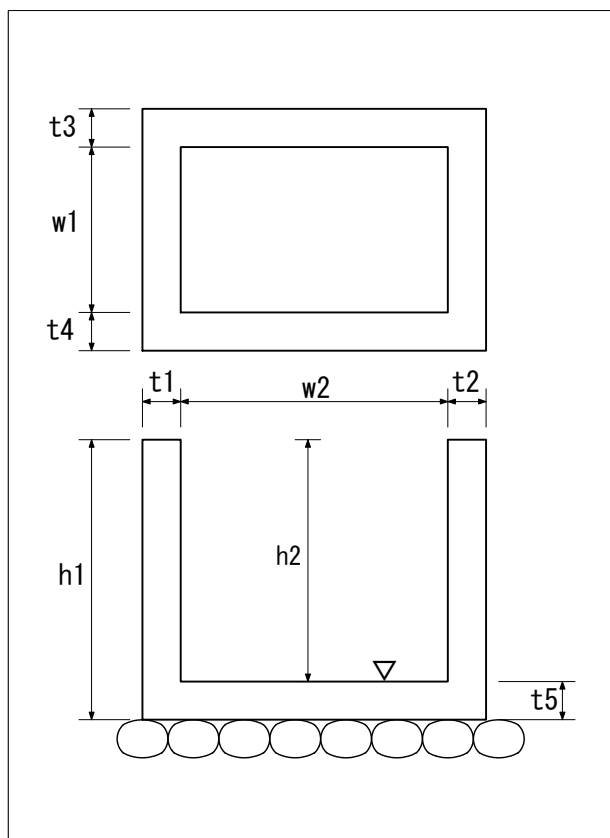

項目 番号	ケーソン天端よりの値		(B) - (A)	備考
	実測値 (A)	設計値 (B)		
$\nabla$	10.020	10.010	+10	許容範囲 ±30 mm
t1	0.160	0.150	+10	
t2	0.160	0.150	+10	

