

新潟農地_出来形フォーマットサンプル

工 種	集水桝・マンホール工 集水桝
-----	----------------

測定結果一覧表

監督員	主任技術者

工 事 名 : サンプル工事


請 負 会 社 名 : 福井コンピュータ

測 定 者 : 福井 太郎



測定項目	測 点	設計値 (A)	実測値 (B)	月 日	設計値との差 (C)=(B)-(A)		管理基準値 (D)	管理基準値との差 (E)=(D)-(C)
					(+)	(-)		
基準高 ()	No.1	10.010	10.020	16/11/1	+10		±25	+15
	No.2	10.020	10.020	16/11/2	0	0	±25	+25
	No.3	10.030	10.020	16/11/3		-10	±25	-15
	No.4	10.040	10.040	16/11/4	0	0	±25	+25
	No.5	10.050	10.060	16/11/5	+10		±25	+15
	No.6	10.060	10.060	16/11/6	0	0	±25	+25
	No.7	10.070	10.060	16/11/7		-10	±25	-15
	No.8	10.080	10.080	16/11/8	0	0	±25	+25
	No.9	10.090	10.100	16/11/9	+10		±25	+15
	No.10	10.100	10.100	16/11/10	0	0	±25	+25
	No.11+1.0	10.110	10.100	16/11/11		-10	±25	-15
	No.12	10.120	10.120	16/11/12	0	0	±25	+25
	No.13	10.130	10.140	16/11/13	+10		±25	+15
	No.14	10.140	10.140	16/11/14	0	0	±25	+25
	No.15	10.150	10.140	16/11/15		-10	±25	-15
	No.16	10.160	10.160	16/11/16	0	0	±25	+25

測定箇所図

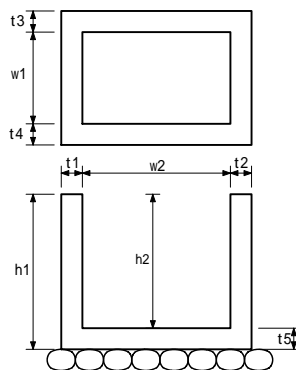

記入事項

1. 工種は「農道工事 下層路盤工」「水路工事 開水路工」等と記入する。
2. 測定項目は、「基準高 (V)」「厚さ (T)」等と記入する。
3. 月日は測定年月日。

